



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



SERVIZIO 2

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 80 del 26/03/2018

Registro servizio 77 del 26/03/2018

del Responsabile : Luordo Michele

**Determina di rimodulazione del quadro economico a stato finale dei
Lavori per il Completamento Palestra Scuola Elementare di via Pescara -
Rione Borgo. - CIG 61962646CE - CUP B54B15000080002**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 59 del 30/03/2015 veniva approvato il progetto esecutivo di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA ? RIONE BORGO", per l'importo complessivo pari ad € 512.164,46 di cui € 395.733,61 per lavori soggetti a ribasso, € 23.270,02 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 116.430,85 per un totale di € 512.164,46 redatto dall'ing. Antonio Salimbene all'uopo incaricato con Determina n. 83 del 27/03/2015b con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	€ 372.463,59
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 395.733,61

Somme a Disposizione

IVA su lavori	€ 39.753,36
Spese Tecniche	
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 39.990,00
Relazione geologica	€ 2.168,50
Collaudo	€ 1.257,00
O.I. Spese Tecniche (Inarcassa 4%)	€ 1.736,62
IVA 22%	€ 9.933,47
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e.i.	€ 4.986,24
Imprevisti (max 5%)	€ 16.785,66
TOTALE somme a disposizione	€ 116.430,85

TOTALE GENERALE	€ 512.164,46
Quota regionale	€ 445.164,46
Quota comunale	€ 67.000,00

VISTO che con determina n. 276 del 30/10/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA ? RIONE BORGO";

VISTO che con Determina n. 282 del 31/10/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
LAVORI	€ 361.289,69
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 384.559,71

Somme a Disposizione

Imprevisti (max 5%)	€ 16.797,98
IVA su lavori e imprevisti	€ 40.135,77
Spese Tecniche	
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
Relazione geologica	€ 1.710,94
Collaudo	€ 700,64
O.I. Spese Tecniche (Inarcassa 4%)	€ 1.633,22
IVA 22%	€ 9.342,03
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 7.691,19
TOTALE somme a disposizione	€ 116.430,72
TOTALE GENERALE	€ 500.990,43
Quota regionale	€ 433.990,43
Quota comunale	€ 67.000,00

VISTO che con Determina 242 del 02/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente all'impresa JOINT SUD srl di Buccino l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA ? RIONE BORGO", per un importo dei lavori pari ad complessivo pari a € 361.289,69 al netto del ribasso d'asta ed € 23.270,02 per oneri sicurezza per un totale di € 384.559,71, oltre IVA al 10%;

VISTO che in data 06/10/2015, protocollo n. 6699, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 06/10/2015 con inizio lavori in data 12/10/2015;

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 384.559,71, stipulato in data 29/10/2015 e registrato ad Eboli il 03/11/2015 al n.1T 5604, al repertorio comunale al n. 24/2015;

VISTA la perizia di assestamento corredata dal verbale di concordamento nuovi prezzi e da atto di sottomissione agli stessi patti e condizioni del contratto originario e che la somma dei lavori pari ad € 384.452,59, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza, rientra nel 5% della discrezionalità della Direzione Lavori, e che i lavori della perizia di assestamento non variano la natura dell'opera, ma rendono più funzionale l'opera stessa;

Visto che con determina n. 317 del 30/11/2015 veniva dato incarico di Collaudatore in Corso d'Opera all' arch. Olga Annunziata, per un importo pari ad € 700,64 oltre oneri contributivi (4%) esente IVA (regime minimi);

Visto che con determina n. 318 del 30/11/2015 veniva dato incarico al geologo dott. Angelo Di Rosario, per un importo pari ad € 1710,94 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%)

VISTA la determina n. 339 del 11/12/2015 di approvazione del SAL n. 1 pari ad € 357.484,95 al netto del ribasso del 3%, della ritenuta per infortuni del 0.5% e dell'IVA al 10%

VISTO la fattura dell'impresa JOINT SUD S.r.l., n. 3-2015 del 10/12/2015, acquisita al protocollo n. 8469 del 10/12/2015, per un imponibile di € 357.484,95 e IVA pari a € 35.748,50 per un importo totale pari ad € 393.233,45;

VISTA la determina n. 341 del 11/12/2015 di approvazione degli oneri tecnici per progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, relativi al SAL 1 per un importo totale di € 33.280,00 comprensivo di oneri contributivi, IVA pari ad € 7.321,60 per un totale di € 40.601,60;

VISTA la fattura n. FATTPA 2-2015 del 09/12/2015, protocollo n. 8421 del 10/12/2015, dell'ing. Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 20.800,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 4.576,00, per un importo totale pari ad € 25.376,00; e la fattura n. FATTPA 3-2015 del 10/12/2015, protocollo n. 8473 del 11/12/2015 dell'ing. Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 12.480,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 2.745,60, per un importo totale pari ad € 15.225,60; per un totale complessivo pari ad € 40.601,60;

VISTO che con nota del 18/12/2015 protocollo n. 8702 il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Salimbene trasmetteva la seguente documentazione:

- 1) SAL Finale
- 2) Certificazione di Ultimazione Lavori
- 3) Certificato di Regolare Esecuzione

VISTO lo Stato Finale dei Lavori di importo dei lavori eseguiti pari ad € 384.452,59 al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 38.445,26 per un totale di € 422.897,85;

Visto le competenze tecniche spettanti ai singoli professionisti, come da determinare:

- ing. Antonio Salimbene in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, determina n. 83 del 27/03/2015 per un importo pari ad € 39.990,00 oltre contributo previdenziale (4%) ed IVA (22%).
- arch. Olga Annunziata in qualità di Collaudatore in Corso d'Opera, con determina n. 317 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 700,64 oltre oneri contributivi (4%) esente IVA (regime minimi);
- geologo dott. Angelo Di Rosario, determina n. 318 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 1710,94 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%)

VISTO la fattura (a Saldo) dell'ing. Antonio Salimbene n. FTTPA 4_15 del 15/12/2015, acquisita al protocollo n. 8628 del 16/12/2015 per un imponibile di € 6.675,71 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 1.468,66, per un importo totale pari ad € 8.144,37;

VISTO la fattura (a Saldo) dell'arch. Olga Annunziata n. FTTPA 1_15 del 17/12/2015, acquisita al protocollo n. 8689 del 18/12/2015 2015 per un imponibile di € 728,66 comprensivo di cassa previdenziale ed oneri, esente IVA (regime minimi);

VISTO la fattura (a Saldo) del geologo dott. Angelo Di Rosario n. FTTPA 7_15 del 14/12/2015, acquisita al protocollo n. 8569 del 15/12/2015 per un imponibile di € 1.745,16 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 383,94, per un importo totale pari ad € 2.129,10;

VISTO che con determina n.367 del 23/12/2015 e stato approvato lo stato finale dei lavori come riportato nel quadro economico :

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI	€ 361.182,57
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 384.452,59

Somme a Disposizione

Imprevisti max 5%	€ 19.304,83
IVA su lavori + imprevisti 10%	€ 40.375,74
Spese Tecniche	
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
Relazione geologica	€ 1.710,94
Collaudo	€ 700,64
Oneri Previdenziali Spese Tecniche	€ 1.599,00
IVA 22%	€ 9.334,50
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24
TOTALE somme a disposizione	€ 116.430,85

TOTALE GENERALE € 500.883,44

DETERMINA

1)Di rimodulare il Quadro Economico a stato finale nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI	€ 361.182,57
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 384.452,89

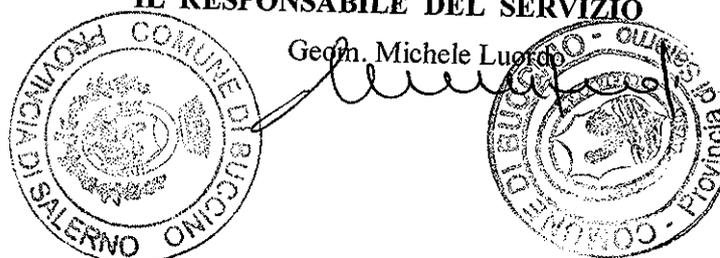
Somme a Disposizione	
Imprevisti (max 5%)	€ 16.797,98
IVA su lavori e imprevisti	€ 40.125,06
Spese Tecniche	
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
Relazione geologica	€ 1.710,94
Collaudo	€ 700,64
O.I. Spese Tecniche (Inarcassa 4%)	€ 1.633,22
IVA 22%	€ 9.342,03
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 7.689,05
TOTALE somme a disposizione	€ 116.417,87
TOTALE GENERALE	€ 500.870,46
Quota regionale	€ 433.870,46
Quota comunale	€ 67.000,00

2) di approvare così come approva, lo Stato Finale dei Lavori per un importo lavori pari a € 384.452,59 comprensivo di oneri sicurezza, al netto del ribasso asta, oltre IVA;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li 26 MAR. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Geom. Michele Luongo



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 26 MAR. 2018

il responsabile
Luordo Michele




Parere di regolarità contabile



Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 26 MAR. 2018

Il responsabile finanziario

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 26 MAR. 2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/06/2018

Il responsabile

